

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Predecessors	15 Feb '09						
							S	S	M	T	W	T	
1	Проект ЗЕЛС	62 days?	Mon 16/02/09	Tue 12/05/09	47%								
2	Припрема на првичен дизајн за имплементација во апликацијата	4 days?	Mon 16/02/09	Thu 19/02/09	100%								
3	Изготвување на конструкција на база за понатамошно градење на проектот	4 days?	Fri 20/02/09	Wed 25/02/09	100%								
4	Имплементирање на Content Management System	6 days?	Thu 26/02/09	Thu 05/03/09	100%								
5	Собирање на дополнителни информации	15 days?	Thu 05/03/09	Wed 25/03/09	90%								
6	Изработка (Измени) на Дизајн предлози	19 days?	Fri 06/03/09	Wed 01/04/09	80%								
7	Изработка на Функционална спецификација	5 days?	Wed 01/04/09	Tue 07/04/09	50%								
8	Одобрување на Функционална спецификација	1 day?	Wed 08/04/09	Wed 08/04/09	0%	7							
9	Изработка на Проектен план	5 days?	Mon 06/04/09	Fri 10/04/09	0%								
10	Одобрување на Проектен план	1 day?	Mon 13/04/09	Mon 13/04/09	0%	9							
11	Завршување на Дизајн фаза	3 days?	Wed 08/04/09	Fri 10/04/09	0%								
12	Програмирање на екстра модули	40 days?	Thu 05/03/09	Wed 29/04/09	39%								
13	Форум	7 days?	Wed 11/03/09	Thu 19/03/09	100%								
14	Коментари по предлог Закони	7 days?	Mon 06/04/09	Tue 14/04/09	0%								
15	Седница	5 days?	Mon 13/04/09	Fri 17/04/09	0%								
16	Е-Управен одбор	3 days?	Mon 13/04/09	Wed 15/04/09	0%								
17	Е-комисии	3 days?	Mon 13/04/09	Wed 15/04/09	0%								
18	е-надзорен одбор	4 days?	Mon 13/04/09	Thu 16/04/09	0%								
19	Календар на активности	3 days?	Mon 30/03/09	Wed 01/04/09	100%								
20	Најдобри практики	2 days?	Tue 07/04/09	Wed 08/04/09	0%								
21	База на корисници	22 days?	Tue 17/03/09	Wed 15/04/09	40%								
22	Проекти во Зелс	3 days?	Thu 02/04/09	Mon 06/04/09	70%								
23	Транспарентност	5 days?	Mon 20/04/09	Fri 24/04/09	0%								
24	Конференции, работилници, трибини	6 days?	Fri 20/03/09	Fri 27/03/09	100%								
25	Вести	2 days?	Thu 05/03/09	Fri 06/03/09	100%								
26	Пребарување	2 days?	Thu 26/03/09	Fri 27/03/09	100%								
27	мапа на сајтот	3 days?	Mon 27/04/09	Wed 29/04/09	0%								
28	Банери	2 days?	Mon 09/03/09	Tue 10/03/09	100%								
29	Испратени барања и мислења	3 days?	Tue 21/04/09	Thu 23/04/09	0%								
30	Прес соопштенија	3 days?	Mon 16/03/09	Wed 18/03/09	100%								
31	ЕУ информации	2 days?	Tue 21/04/09	Wed 22/04/09	0%								
32	Фото Галерија	3 days?	Wed 08/04/09	Fri 10/04/09	0%								
33	Членки на Зелс	2 days?	Mon 06/04/09	Tue 07/04/09	0%								
34	Интерно Тестирање на екстра модули	5 days?	Mon 20/04/09	Fri 24/04/09	0%								
35	Имплементација на финалното решени на Сервер	2 days?	Mon 27/04/09	Tue 28/04/09	0%								
36	Тестирање на финалното решени	3 days?	Thu 30/04/09	Mon 04/05/09	0%	12							
37	Исправка на грешки на финалното решение	5 days?	Tue 05/05/09	Mon 11/05/09	0%	36							

Project: ProjectZels
Date: Mon 06/04/09

Task



Milestone



External Tasks



Split



Summary



External Milestone



Progress



Project Summary



Deadline



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	% Complete	Predecessors	15 Feb '09						
							S	S	M	T	W	T	
38	Одобрување на финалното решени	1 day?	Tue 12/05/09	Tue 12/05/09	0%	37							




Project: ProjectZels Date: Mon 06/04/09	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	

		22 Feb '09							01 Mar '09							08 Mar '09							15 Mar '09							22 Mar '09							29 Mar '09				
F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T



Project: ProjectZels Date: Mon 06/04/09	Task		Milestone		External Tasks	
	Split		Summary		External Milestone	
	Progress		Project Summary		Deadline	

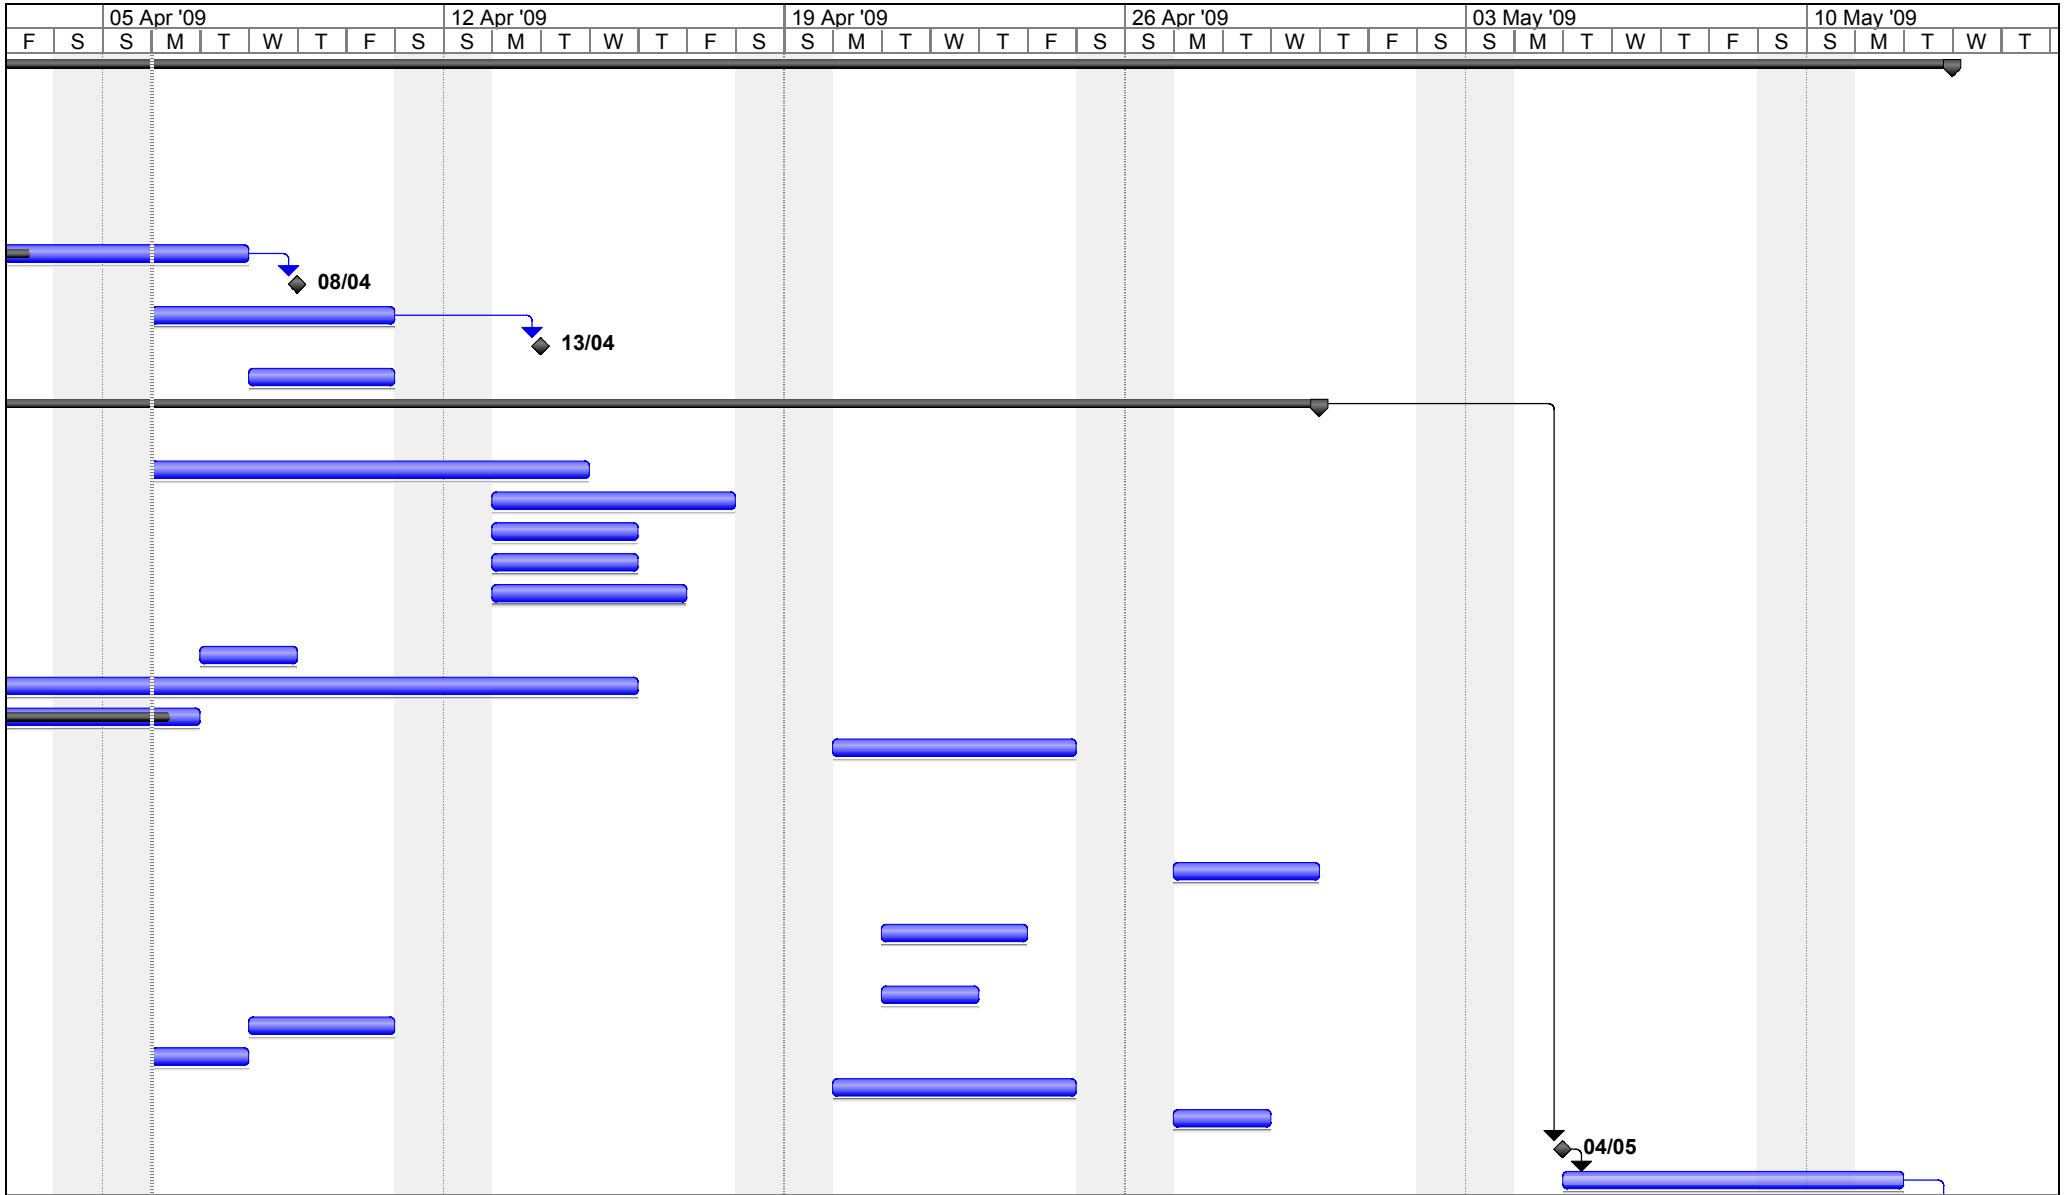

Project: ProjectZels
Date: Mon 06/04/09

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	

